

# 事例 1 4：ダンプ荷台から転落し作業員が負傷

施工

土木・建設工事

墜落・転落

作業完了後、荷物の受け渡しのためにダンプの荷台に上ろうとしたところ、足を滑らせて転落し、負傷した。

## 原因

- 作業員があおりを上げたままダンプの荷台に上がろうとした。
- 雨天時で滑りやすい状況で、高齢の作業員が高所に上ろうとした。
- ダンプの荷台上が整理整頓されていなかった。

## 結果：負傷


- 左手首及び左大腿骨の骨折

## 教訓

- ① 作業員がダンプの荷台に昇降する際にはあおりを下げることを徹底する。
- ② 作業手順を確認する段階で、作業員の能力に応じた現場配置を行わせる。
- ③ ダンプの荷台上は、常に整理整頓しておく。

## 行動

- 作業終了後、作業員が荷物の受け渡しのためにダンプの荷台に上ろうとしたところ、足を滑らせて転落

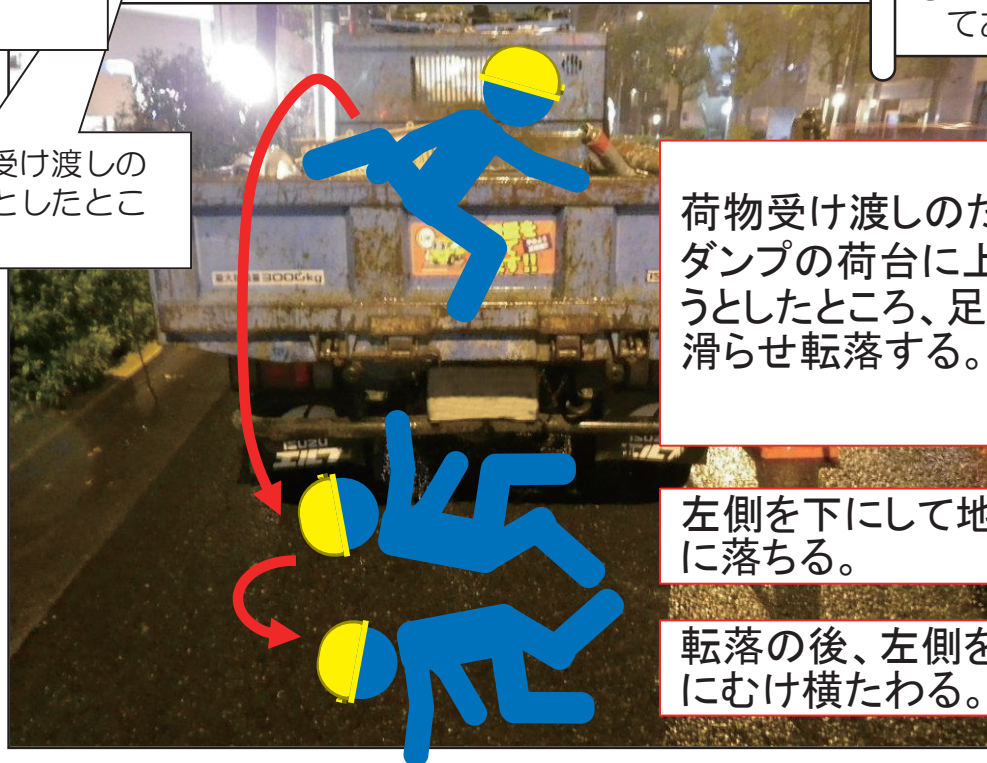

荷物受け渡しのためダンプの荷台に上ろうとしたところ、足を滑らせ転落する。

左側を下にして地面に落ちる。

転落の後、左側を上にもむけ横たわる。
