
令和８年度　水道局イメージアップコンクール　受賞者の声

【工事件名】	東大和市南街三丁目５０番地先から 同市桜が丘一丁目１４２５番地先間配水小管布設替工事	【施工部署】	東京水道株式会社 多摩水道技術本部 多摩管路部 立川管路管理事業所
【受注者】	株式会社 村尾重機	【受賞部門】	小口径管路工事部門 優良賞

【工事内容】
・本工事は非耐震継手管取替工事の一環として口径φ250mmからφ75mmまでの布設替えを行います。
新設・布設替・撤去の管路総延長は約3,075m。

【施工環境】
西武拝島線東大和市駅に近接し大学、小学校も隣接しており交通量及び通勤通学で利用する自転車・歩行者が非常に多い場所である。
また、大型商業施設、店舗が多数営業している。
他企業埋設物多い。（電気・通信・ガス）

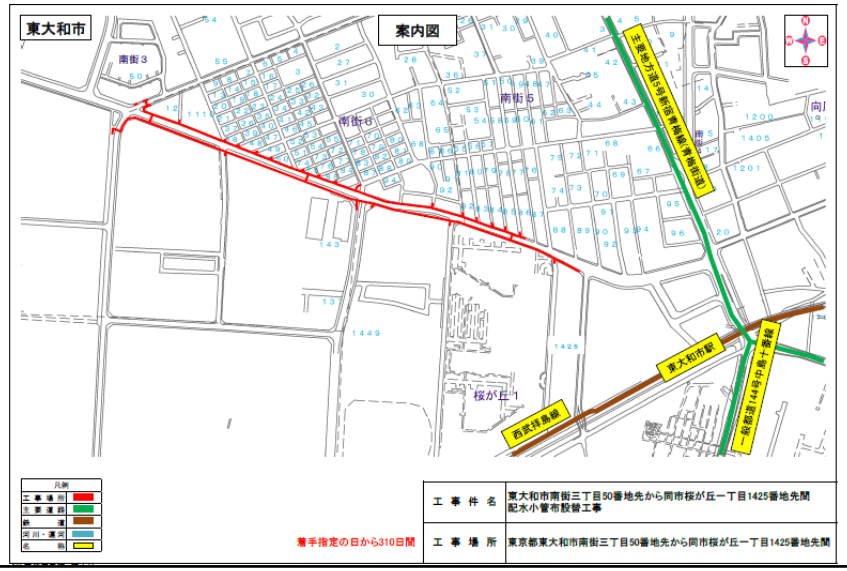

【受賞者の声】
・苦労した点
交通量、歩行者や自転車が非常に多く
交通渋滞や通行者にとても気を使う環境での施工。
・特に工夫した点
施工時間の短縮。
夕暮れ時には交通量が増えるため施工量の短縮。
第三者や地域住民への飛散防止及び樹木の保護を徹底した。
・自社が取り組んでいる社会貢献
HTT：減らす・作る・貯める
・現場で得られたやりがいや達成感
蓄電池や防音シートの使用で騒音を軽減し環境整備、日常生活を保った事により苦情無く施工を行った。



水道に関する情報掲示。
災害時の給水拠点をQRコード表示し、水道工事事業をPR。



夜間作業時、歩行者の誘導をプロジェクターによる路面投影。
給電も充電式バッテリーを使用。



夜間作業時に防音シートの活用。
住民様の車両や植込みには飛散防止養生及び　重機の排気ガス等による熱枯れ防止養生を実施。
